

市町村名		北大東村					
令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	5	北大東村葬祭場建築事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-イ	
担当部署名	福祉衛生課	事業実施(予定)年度	平成30~令和元年度	沖縄振興基本方針該当箇所	生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サービスの向上		
事業内容	既存火葬場の老朽化と火葬ホール・霊安室・管理室等の施設機能が十分に果たせていないため、葬祭場一式の新築整備を行う。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和3年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H30年度	R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	
		(a)当初予算額	40,000	360,000	-		
		(b)予算現額	36,936	128,174	-		
		(c)増減額(b-a)	▲3,064	▲231,826	-	0	0
		(d)繰越額	-	-	231,826		
	A.計(b+d)	36,936	128,174	231,826	0	0	
	B.執行済額	36,936	128,174	231,826			
	うち交付金充当額	29,548	102,539	185,461			
	次年度繰越額	0	231,826	0			
	執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
予算の状況の説明		工事箇所が地域的に集中したことにより労働者の手配に不測の日数を要したため、工事にかかる231,826千円を令和2年度に繰越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	R1活動目標(指標)		達成状況				
	葬祭場施設の整備	目標	(基本・実施設計の完了)	(施設整備の完了)	()	()	
		実績	基本・実施設計の完了	施設整備の完了			
		目標	()	()	()	()	
		実績					
	達成状況説明		平成30年度に基本・実施設計を完了し、令和2年度に施設整備を完了した。				
成果目標(指標)及び進捗状況	R1成果目標(指標)		基準値(年度)	H30年度	R1年度	R2年度	目標値(R3年度)
	葬祭場施設の整備	目標	()	(基本・実施設計の完了)	(施設整備の完了)	()	()
		実績		基本・実施設計の完了	施設整備の完了		
	【参考指標】住民の福祉が向上したか(80%以上)を含め、アンケートにより本事業のあり方を検証する。	目標	()	()	()	(80%以上)	(80%以上)
		実績				未実施	
進捗状況説明		工事箇所が地域的に集中したことにより、労働者の手配調整及び島内宿泊施設が少ないことから労働者の調整ができても宿泊施設の手配に至らないことにより不測の日数を要したため、事業の完了が令和3年3月まで伸びた。そのことにより施設の使用実績がなく令和2年度内でのアンケートが取れなかったため令和3年度にアンケートを実施し事業のあり方を検証する。					


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	小規模離島故に遺体の保冷事案や火葬実績は多くはないものの突発的に出てくる状況である。	頻繁に使用ができるものではないため定期的なメンテナンスが必要である。

今後の取り組み方針

急な施設稼働時に稼働できないような事案などが起こらないようメンテナンスを行いつつ住民福祉の向上を目指していく。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		市町村負担金		
#####	360,000	288,000	72,000	0

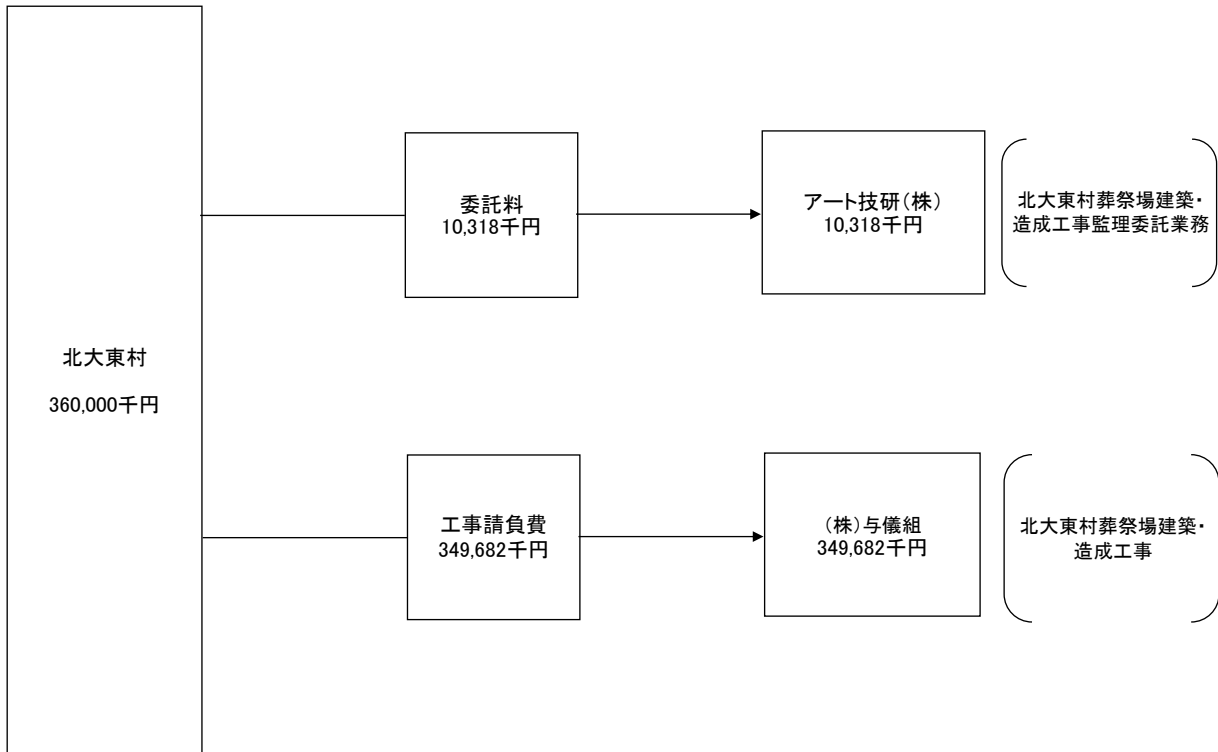

資金の 用途の 流れ、 費目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託業者は指名競争入札により適正に選定しており、妥当であった。 ○予算規模については適正な規模であったと考えている。 ○費目・用途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	北大東村						
令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	6	北大東村水産施設等海水供給施設整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-イ		
担当部署名	経済課	事業実施(予定)年度	令和元~令和2年度	沖縄振興基本方針該当箇所	流通・販売・加工対策の強化		
事業内容	鮮度保持を行う水産施設等へ海水を供給し、水産業の振興を図るため、新たに海水供給施設を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和3年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	R4年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	50,000	-			
		(b)予算現額	50,000	-			
		(c)増減額(b-a)	0	-	0	0	0
		(d)繰越額	-	33,890			
	A. 計(b+d)		50,000	33,890	0	0	0
	B. 執行済額		16,110	33,890			
	うち交付金充当額		12,887	27,112			
	次年度繰越額		33,890	0			
	執行率(%) (B/A)		32.2%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
予算の状況の説明		取水箇所の再検討に不測の日数を要したため、工事にかかる33,890千円を令和2年度に繰越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	R1活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	海水供給施設整備	目標	(取水施設の整備)	()	()	()	
		実績	取水施設の整備				
		目標	()	()	()	()	
		実績					
達成状況説明	令和2年度に取水施設の整備が完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R1成果目標(指標)		基準値(年度)	R1年度	R2年度	R3年度	目標値(R3年度)
	海水供給施設整備	目標	()	(取水施設の整備)	()	()	()
		実績		取水施設の整備			
	【参考指標】 鮮魚の島外出荷量	目標	()	()	()	()	(35.4t以上/年)
		実績					
	進捗状況説明	鮮魚の島外への出荷量が増加することで、水産業の振興が図られると考え設定した。指標については、R2年漁獲量見込量の額から島内の鮮魚消費量を差し引き算出した。35.4(t)=53.9(t)-18.5(t)					


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	ボーリングを進めていく中で想定以上に岩が硬く採掘機の故障が相次いだ。	岩の硬さも確認できたことからその硬さに対応可能な採掘機を使用し工事が円滑に行えるようにする必要がある。

今後の取り組み方針

流通強化の観点からスムーズに工事完了するように着手する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
50,000	50,000	39,999	10,001	0

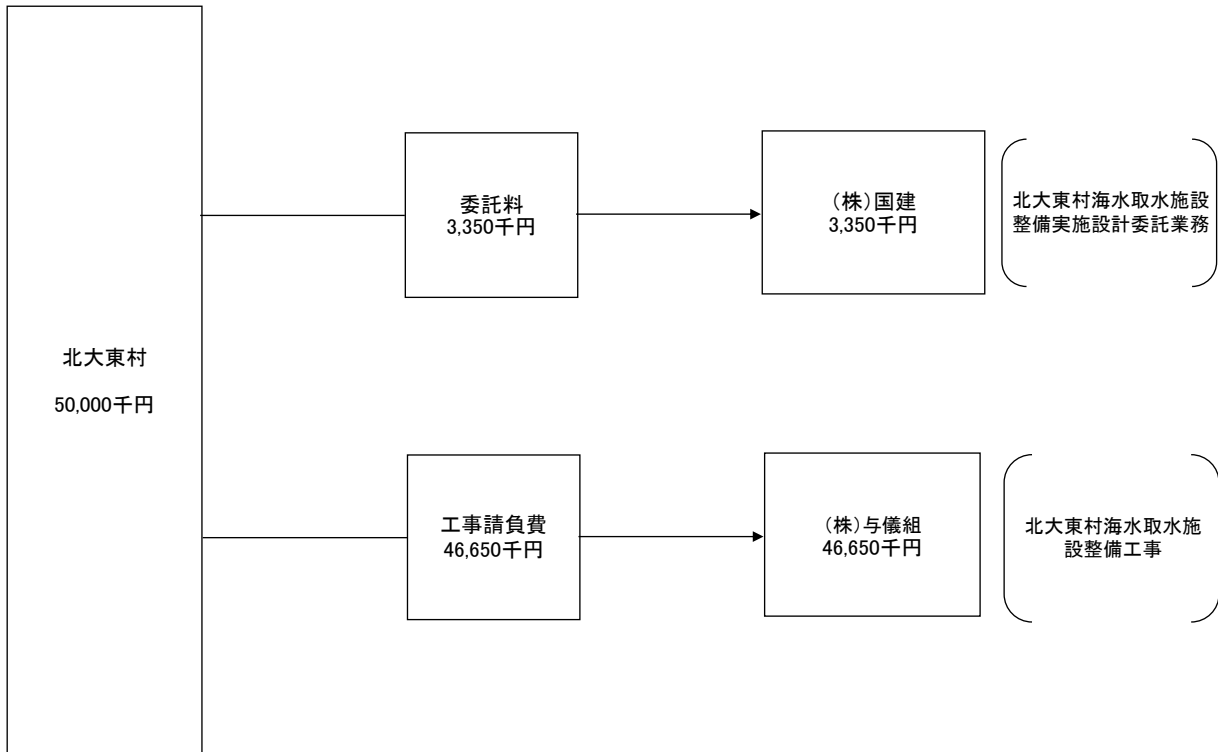

資金の 用途の 流れ、 費目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託業者は指名競争入札により適正に選定しており、妥当であった。 ○予算規模については適正な規模であったと考えている。 ○費目・用途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
